

Contents

Relatório de Encerramento: Sprint 2 - Projeto Finta	1
1. Objetivo	1
2. Atividades e Entregas da Sprint	1
2.1. Histórias de Usuário Concluídas	1
2.2. Validação das Entregas	1
2.3. Situação dos Quadros (Kanban)	1
Quadro Kanban de Riscos	2
Quadro Kanban da Sprint	2
3. Indicadores de Desempenho	2
4. Retrospectiva Final	4
4.1. Principais Acertos	4
4.2. Dificuldades Enfrentadas	4
4.3. Riscos Ocorridos e Soluções	4
4.4. Melhorias Aplicadas	4
4.5. Lições Aprendidas	4
5. Pendências e Repositório	5

Relatório de Encerramento: Sprint 2 - Projeto Finta

1. Objetivo

Este documento formaliza o encerramento da Sprint 2, revisando as entregas realizadas, validando os critérios de aceite e consolidando a retrospectiva final do semestre, com foco na implementação da interface de linha de comando (CLI) do ecossistema Finta.

2. Atividades e Entregas da Sprint

2.1. Histórias de Usuário Concluídas

Todas as histórias planejadas para esta sprint foram implementadas e integradas à CLI:

- **Cadastro via CLI:** Possibilidade de criar uma conta no Finta diretamente pelo terminal.
- **Login via CLI:** Autenticação de usuários existentes no terminal utilizando o comando `finta`.
- **Visualização de detalhes de ativos:** Acesso à tela de indicadores de ativos através da interface de texto.
- **Dashboard Financeiro:** Visualização do resumo financeiro consolidado na tela inicial da CLI com as mesmas informações do dashboard na web.
- **Gestão de Favoritos:** Funcionalidade de adicionar e remover ativos da lista de favoritos pelo terminal.
- **Bônus:** Integração de agente de IA para operação da CLI via linguagem natural através de uma skill.

2.2. Validação das Entregas

As entregas foram validadas com base nos critérios de aceite de funcionamento em ambiente Unix-like, garantindo que os comandos executados no terminal reflitam as mesmas informações presentes na plataforma web.

2.3. Situação dos Quadros (Kanban)

Abaixo, a evidência do estado final das atividades e do gerenciamento de riscos:

Quadro Kanban de Riscos

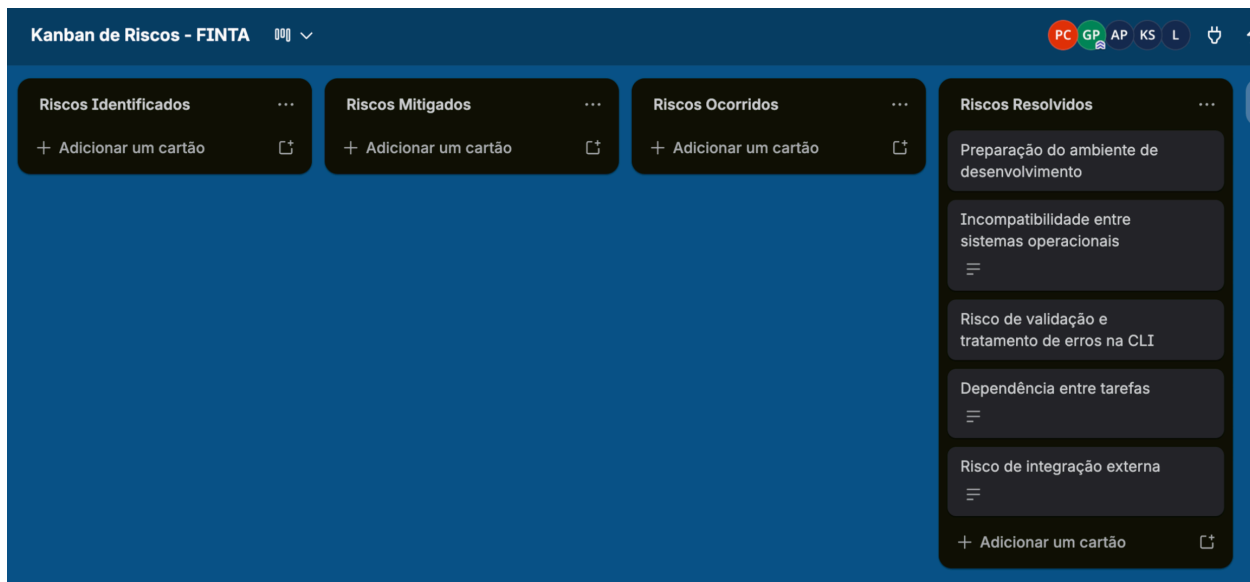


Figure 1: image

Quadro Kanban da Sprint

3. Indicadores de Desempenho

Throughput

~2/3 tasks/semana

Lead Time

- Criação: 11/04/2026
- Finalização: 08/05/2026
- Lead Time: 14 dias

Cycle Time

3 dias

Velocity > 20 pontos de história

Burndown

WIP (Work in Progress)

O WIP foi estimado com base no quadro Kanban da sprint e nas datas de início das branches/PRs. O objetivo foi identificar quantas tarefas estavam em desenvolvimento simultâneo em cada momento da sprint.

Período	Itens em andamento	WIP
11/04 a 12/04	ROBERTO-49	1
13/04 a 23/04	ROBERTO-51, ROBERTO-44	2
06/05 a 08/05	ROBERTO-50, ROBERTO-43	2

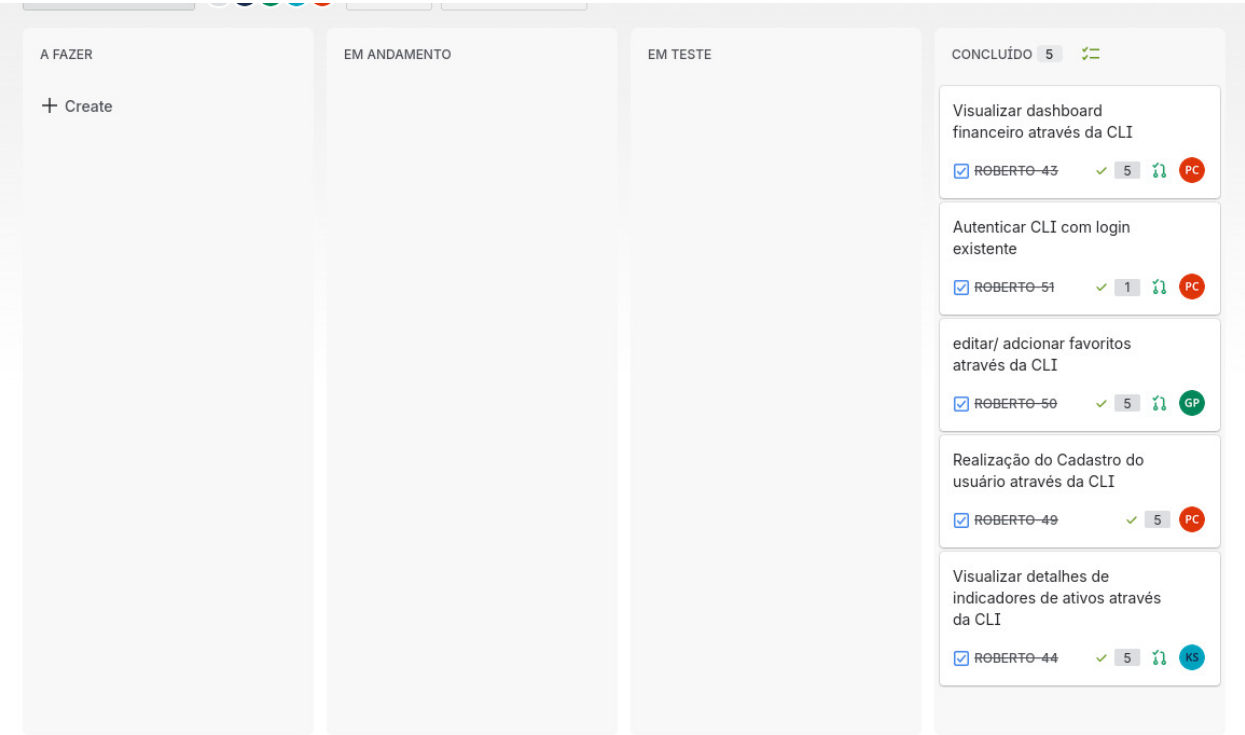


Figure 2: kanban_sprint

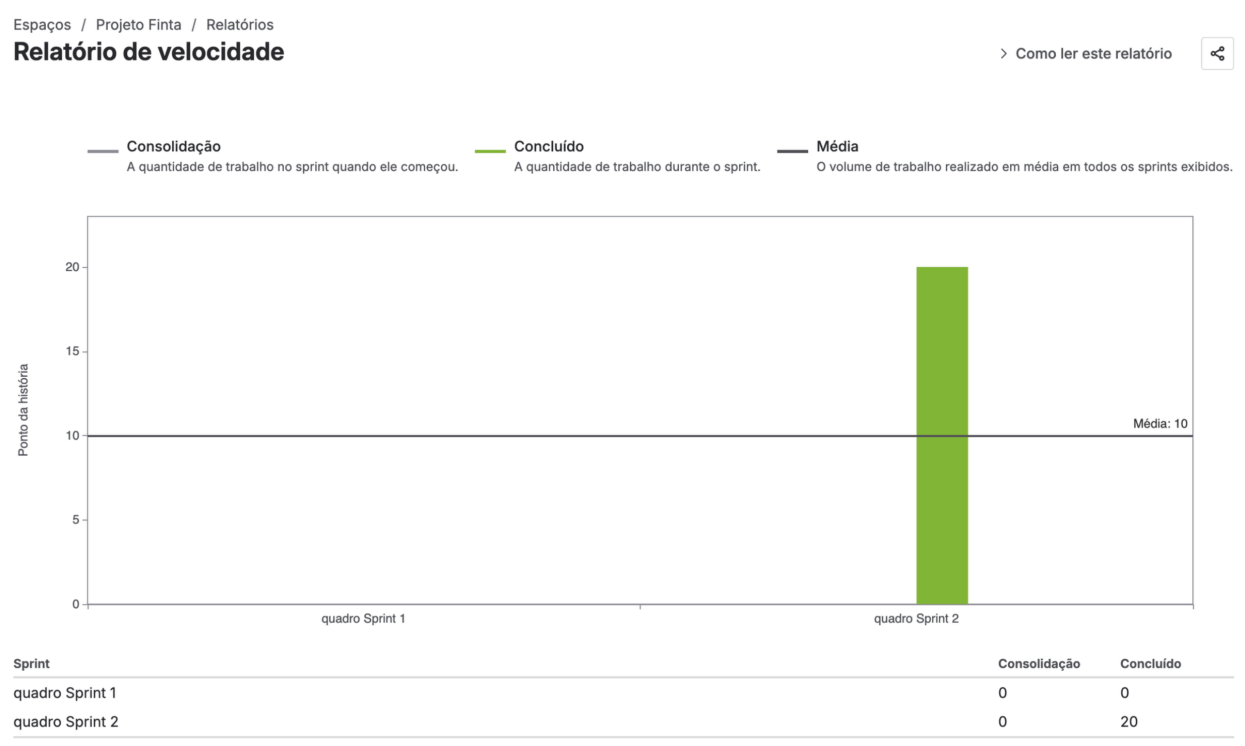


Figure 3: image

Data - 18 de abril de 2026 - 9 de maio de 2026

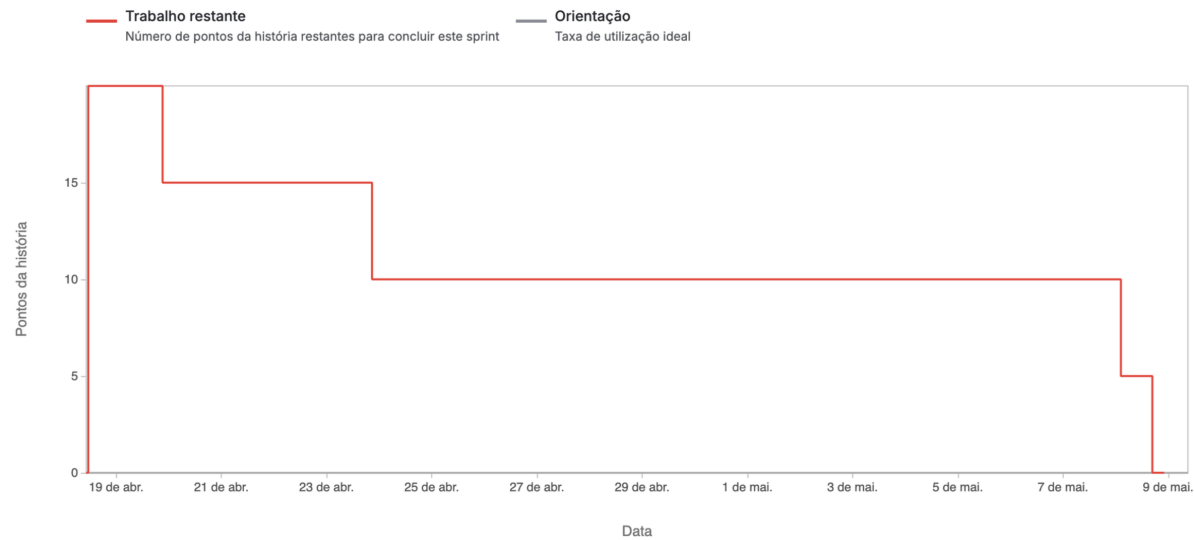


Figure 4: image

O pico de WIP identificado foi **2 itens simultâneos**. Esse volume indica que a equipe conseguiu paralelizar o desenvolvimento sem acumular excesso de trabalho em andamento, mantendo uma distribuição controlada das tarefas ao longo da sprint.

4. Retrospectiva Final

4.1. Principais Acertos

- **Paralelização do esforço:** A equipe conseguiu distribuir as tarefas da CLI de forma simultânea.

4.2. Dificuldades Enfrentadas

- **Gerenciamento de tempo:** Ajustar o cronograma de desenvolvimento com as entregas das outras disciplinas.

4.3. Riscos Ocorridos e Soluções

- **Incompatibilidade de SO:** Identificada incompatibilidade com Windows. **Solução:** Foco total em sistemas Unix-like para garantir estabilidade.
- **Ambiente de Desenvolvimento:** Complexidade na configuração inicial. **Solução:** Padronização via `pnpm install` e definição clara de variáveis de ambiente.

4.4. Melhorias Aplicadas

- **Otimização de Agentes:** Criação do arquivo `AGENTS.md` para fornecer contexto reutilizável às IAs, aumentando a produtividade da equipe.

4.5. Lições Aprendidas

- Ao invés de expandir o escopo do projeto, o grupo preferiu pivotá-lo para algo mais simples, focando na qualidade final do produto.

5. Pendências e Repositório

- **Histórias Pendentes:** Nenhuma. Todas as metas da Sprint 2 foram atingidas conforme o planejamento.
- **Link do Repositório:** <https://github.com/p4cs-974/projeto-finta/tree/main>
