Template – Relatório Parcial Sprint 2

1. Identificação da Equipe

Nome da equipe: FInta

Integrantes: Kawan Mark, Pedro Alexandre, Gabriel Albertini, Lucas Roberto e Alexandre Pierri

Projeto: `FINTA – Sistema de Acompanhamento e Análise Financeira`

Data: 25/04/2026

2. Status Geral da Sprint

(X) Em dia

( ) Com atraso leve

( ) Em Risco

( ) Atrasado

Resumo:

A Sprint 2 esta em andamento com progresso consistente e sem bloqueios criticos no quadro Jira. No momento da coleta, ha 3 historias concluidas e 2 historias em andamento, com 0 itens em "A fazer" e 0 itens em "Em teste".

Foram identificados ajustes de escopo durante a execucao (modificacao de pontos em 4 itens), porem a equipe manteve capacidade de entrega e acompanhamento continuo por Kanban e revisoes frequentes.2

3. Progresso das Histórias de Usuário

HU	Descrição	Status	Observação
ROBERTO-43	Visualizar dashboard financeiro atraves da CLI	Em andamento	Implementacao dentro do fluxo da sprint. Comando principal retorna dados; pendente exibibição e padronização.
ROBERTO-50	Correcao editar/adicionar favoritos atraves da CLI	Em andamento	Ajustes de comportamento e validacao em progresso. Fluxo realizado em partes, pendente validação de adição e verificação dos favoritos
ROBERTO-51	Autenticar CLI com login existente	Concluida	Entrega finalizada e integrada. Login existente validado no fluxo principal, com persistência de sessão para uso dos comandos protegidos
ROBERTO-49	Realizacao do cadastro do usuario atraves da CLI	Concluida	Funcionalidade concluida na sprint. Cadastro finalizado com resposta esperada de sucesso e tratamento básico para dados inválidos
ROBERTO-44	Visualizar detalhes de indicadores de ativos atraves da CLI	Concluida	Entrega concluida com suporte ao fluxo principal. Consulta de indicadores entregue com retorno consistente no terminal para os ativos suportados

4. Indicadores Parciais

Indicador	Valor Atual	Observação
WIP	2 histórias em andamento (10 pontos)	Fluxo ativo sem fila em “A fazer”; equipe concentrada em finalizar 2 itens antes de abrir novas frentes
Throughput	3 histórias concluídas (11 pontos)	Entregas distribuídas entre autenticação, cadastro e consulta de indicadores
Burndown	10 pontos done / 10 pontos to go	Houve alteração de escopo na sprint: +20 pontos por modificação em 4 histórias

5. Impedimentos Encontrados

Impedimento	Impacto	Ação Tomada
Validação de parâmetros na CLI (entradas incompletas e formatos inválidos)	Aumentou o tempo de ajuste nas HUs ROBERTO-43 e ROBERTO-50	Criação de checklists de validação por comando e revisão em dupla para os fluxos críticos
Dependência entre tarefas de autenticação e favoritos	Bloqueio parcial de testes ponta a ponta	Priorização da autenticação e sincronização diária para destravar integração
Ajustes de escopo durante a sprint	Replanejamento de esforço no meio da execução	Replanejamento de esforço no meio da execução

6. Riscos Atualizados

Risco	Probabilidade	Impacto	Situação
Risco de validação e tratamento de erros na CLI	Alta	Médio/Alto	Ocorrido
Risco de integração externa	Média	Médio	Mitigado
Preparação do ambiente desenvolvimento	Baixa	Médio	Resolvido
Dependência entre tarefas	Média	Média	Mitigado
Incompatibilidade entre sistemas operacionais	Baixa/Média	Médio	Mitigado

7. Próximos Passos até a Review

- Finalizar ROBERTO-43 com ajustes finais de exibição e testes de regressão no fluxo do dashboard.
- Concluir ROBERTO-50 com validações de entrada, mensagens de erro e cenários de exceção para favoritos.
- Consolidar evidências da sprint (prints, status final do board, riscos atualizados e métricas) para apresentação na Review.
- Executar rodada final de testes integrados da CLI (cadastro, login, favoritos e indicadores) antes do encerramento da sprint.

8. Evidências

Jira:

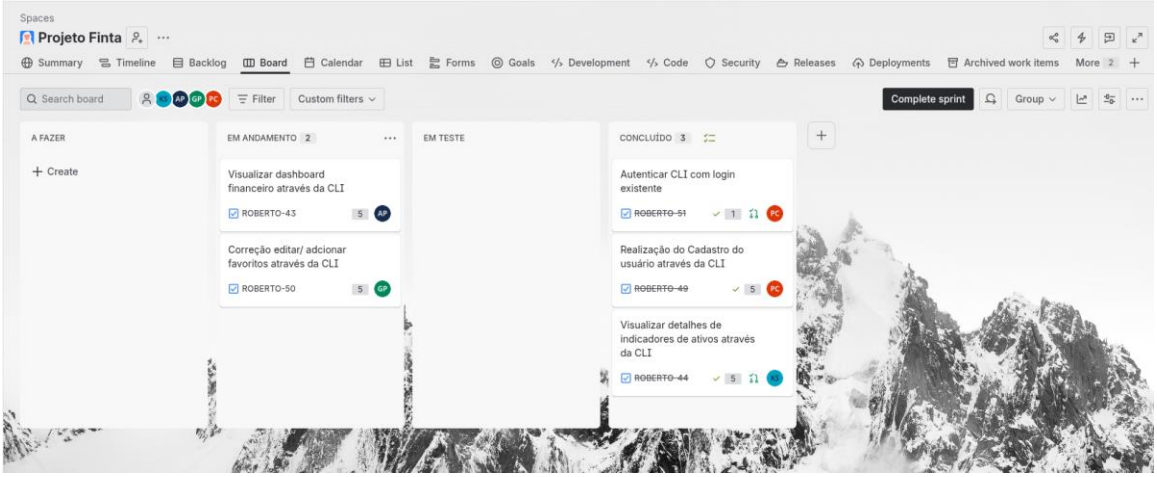
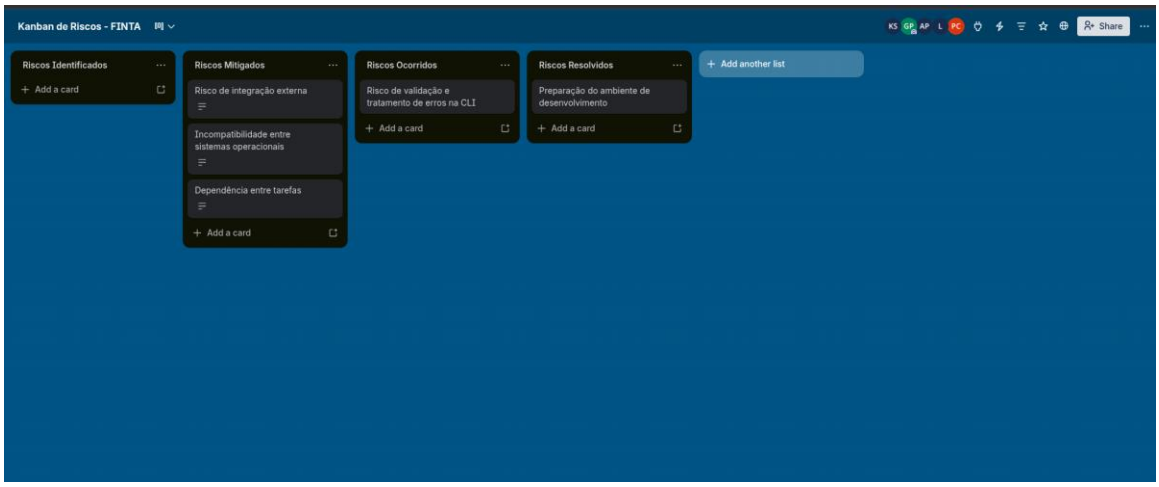
Kanban de riscos:
